

Agenda.

Allgemeine Informationen.

Erfolge 2023.

Baustelleneinrichtungen. Baustellen nach Sektor Ende 2023 bis 2024.

Allgemeine Informationen.


Beginn der Tunnelarbeiten.

Infolge des positiven Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts über die Vergabe von Los 2 (Tunnel) können die Bauarbeiten beginnen.





Voraussichtlicher Terminplan.

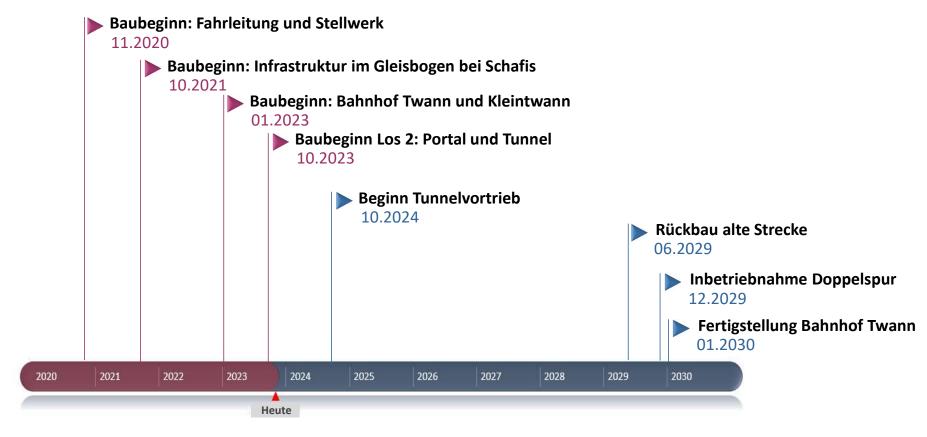

Erfolge 2023.

2023 - Bahnhof Twann.






BehiG-Anpassung des Bahnhofs:

- → neue Aussenperrons,
- → neue Gleisgeometrie,
- → neue Personenunterführung,
- → Entwässerung.

2023 - Kleintwann.







Anpassung der Twannbach-Brücke:

- → Abbau der Brücke auf dem Strandweg,
- → Anpassung der Eisenbahnbrücke,
- → Installation einer provisorischen Passerelle.

Ligerz-Tunnel – Vorstellung der Baustellen 2024 – Oktober/November 2023

2023 - Tüscherz.

Erneuerung der Fahrleitung (Fundamente und Masten), Kabelkanäle.











2023 - Gals.

- → Ökologische Ersatzmassnahmen auf Verlangen des Kantons Bern.
- → Bauarbeiten abgeschlossen.

Ligerz-Tunnel – Vorstellung der Baustellen 2024 – Oktober/November 2023

Baustelleneinrichtungen.

Baustelleneinrichtung am Westportal.



Unverbindliche 3D-Illustrationen zu Informationszwecken.

Baustelleneinrichtung am Ostportal.



Unverbindliche 3D-Illustrationen zu Informationszwecken.

Emissionen.



Zahlreiche Massnahmen zur Lärmminderung an der Geräuschquelle:

- → Lärmschutzwände,
- → Lärmschutzmatten in unmittelbarer Nähe der Maschinen,
- → Abdeckung des Trichters und des Förderbands.

Installation von Geräusch-, Erschütterungs- und Staubsensoren zur Überwachung der Belastung von Anwohnerinnen und Anwohnern.



Voraussichtlichere Arbeitszeiten nach Sektor.



Legende:

Tagarbeiten 7-12 Uhr und 13-18 Uhr (in Ausnahmefällen bis 19 Uhr)

Tunnelvortrieb 6–22 Uhr

Arbeiten bei laufendem Bahnbetrieb 7-12 Uhr, 13-18 Uhr, 22-6 Uhr

mit Ausnahme von dringenden Sicherheitsarbeiten.

Informationskanäle.

SBB CFF FFS



Sehr geehrte Anwohnerin, sehr geehrter Anwohner,

Im Rahmen des Projekts zur Doppelspurausbau zwischen Ligerz und Twann gehen die Baustellen planmässig weiter. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Arbeiten.

Sektor Marnins - Poudeille

Datum	Zeiten	Art der Arbeiten	Nacht- Alarmanlage
01.11 - 30.11	Tagesarbeit	Fahrleitung: Abschlussarbeiten	Nein
01.11 - 16.12	Tagesarbeit	Chemin des Marnins: Neugestaltung	Nein

Die Daten und Uhrzeiten stammen aus der theoretischen Arbeitsplanung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. verspätete Züge, schlechte Witterungsverhältnisse, defekte Maschinen) sind Abweichungen möglich. Arbeitszeiten und Arbeitsprogramm müssen gegebenenfalls spontan an die Umstände angepasst werden.

- → Monatliche und detaillierte Baustellenankündigung.
- → Projekt-Webseite:




www.sbb.ch/ligerztunnel

→ E-Mail Adresse: tunnel.ligerz@cff.ch

Baustellen nach Sektor Ende 2023 bis 2024.




Schafis-Kurve - Ende 2023.

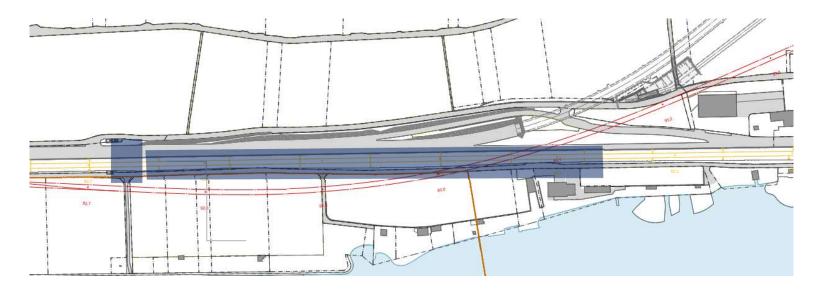

- → Installation der Baustelleneinrichtungen.
- → Umleitung der provisorischen Autobahnausfahrt.
- → Ausbau des Ostteils der Unterführung Marnin-Frieses.


Schafis-Kurve - 2024.

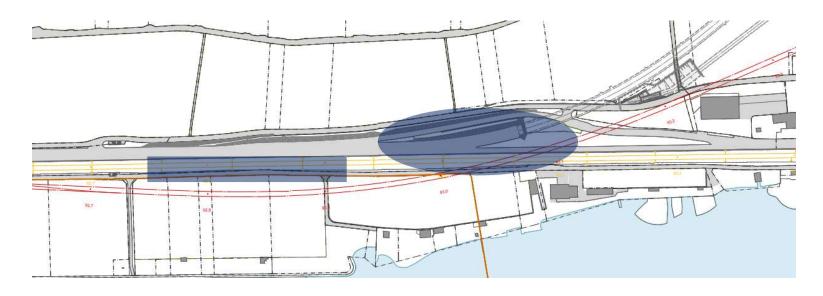

- → Installation der Baustelleneinrichtungen (Container für die Mitarbeitenden).
- → Erstellen der Bohrpfähle des N5-Viadukts.
- → Bau der Pfeiler und Brückenplatte des N5-Viadukts.




Westportal – 1. Etappe (Ende 2023 bis Mitte 2024).

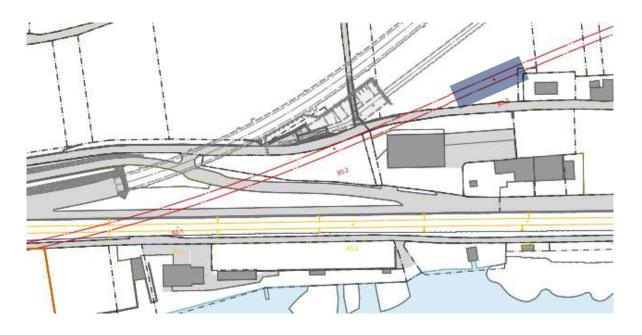

- → Bau der Rühlwand.
- → Erdarbeiten im Bereich des Trichters, Errichtung der Trichterbedachung Herbst 2024.

Westportal – 2. Etappe (2024).

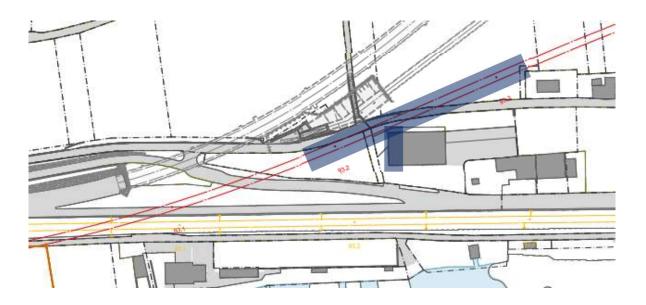

- → Erdbauarbeiten für die Arbeitsplattform, Erstellen der Bohrpfähle, Betonieren der Decke, Tunnelausbruch in Deckelbauweise.
- → Betonieren der Sohle.
- → Teilabbruch Standconcept-Halle.






Tunnelvortrieb 2024.

- → Beginn des Tunnelausbruchs mit Sprengstoff: 10.2024.
- → Vortrieb und Materialabtransport vom Westportal.




Ostportal – 1. Etappe 2024.

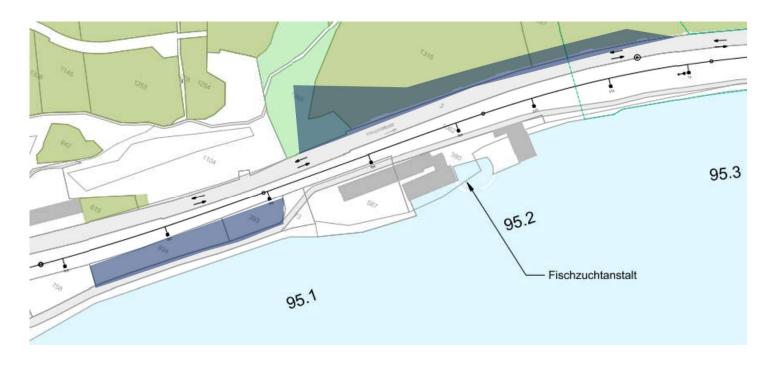


- → Baustelleneinrichtung und Felssicherung (Helikoptertransport).
- → Erdbauarbeiten und Ankerwände des Portals.

Ostportal – 2. Etappe ab Mitte 2024.

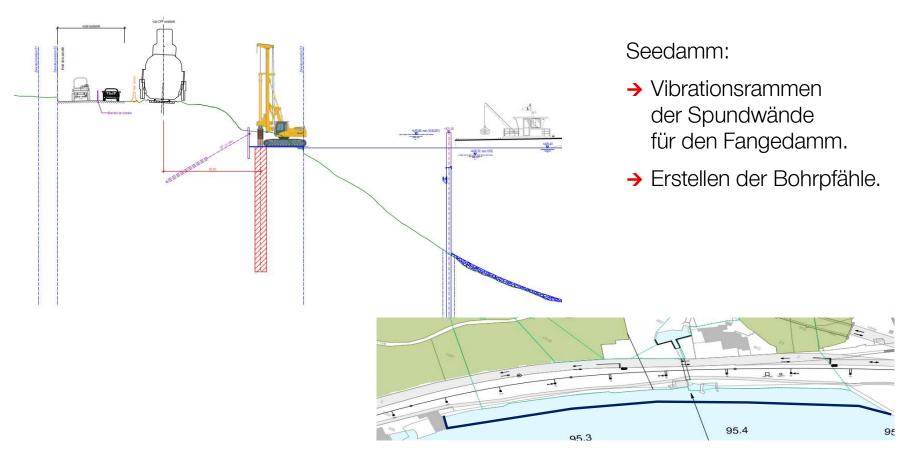


Brunnmühle - Mitte 2024.

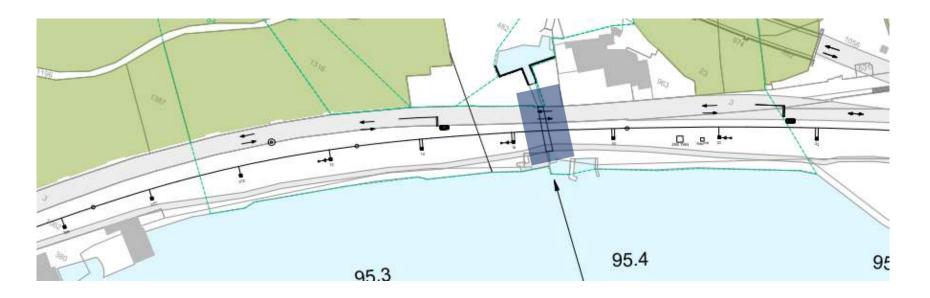

→ Erstellen der Bohrpfähle für den Brunnmühle-Durchlass.




Kleintwann - Oktober 2023 bis Juni 2024.

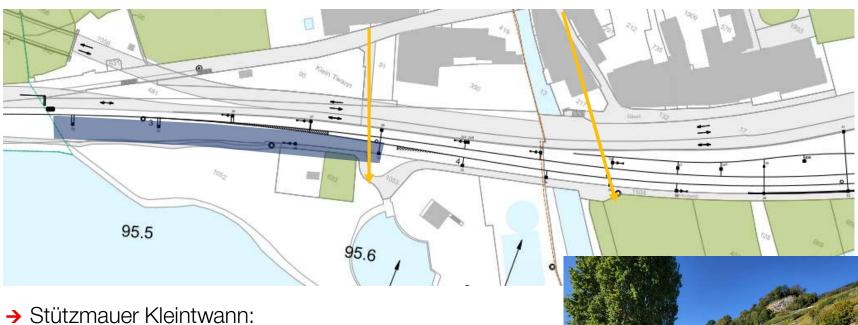

- → Stützmauer Kleintwann: Bohrungen, Verankerungen, Spritzbeton.
- → Verlängerung der Unterführung Kleintwann.
- → Strand teilweise zugänglich via Unterführungen Kleintwann oder Moos.




Twann - Ende 2023.



- → Rückbau der Stützmauer für den Bau neuer Rampen, Bau Technikraum und Rückhaltebecken (Tagarbeiten).
- → Entwässerung, Erneuerung von Schienen und Fahrleitung (Nachtarbeiten vom 5. November bis 20. Dezember 2023).

Twann – Januar bis Mai 2024.



- → Entwässerung, Erneuerung von Schienen und Fahrleitung (Tag- und Nachtarbeiten).
- → Perronausstattung, Perrondach, Warteraum, Signaletik (Tagarbeiten).

Twann - Mai bis August 2024.



- → Abschlussarbeiten am Bahnhof: Ausstattung, Kabel und Fahrleitung.
- → Rückbau des Gebäudes und Bau der dorfseitigen Rampe nach der Inbetriebnahme des Tunnels.



Tüscherz – Februar bis September 2024.



- → Erneuerung der Fahrleitung (Fundamente, Masten, Joch).
- → Erneuerung der Kabelkanäle.

Ausschliesslich Nachtarbeiten entlang der Gleise (unter der Autobahn).

